

ACTA

Versión:	2
Fecha de aprobación:	3-05-2018
Código:	02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN OTRO ___

NÚMERO DE ACTA: 03

FECHA: 31 de marzo de 2023

LUGAR: T. Urgencias USS Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

HORA FINAL: 10:00 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Recorrido por la obra
4.	Presentación de los avances de la obra
5.	Intervención de los Veedores
6.	Proposiciones y Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Envío del video del proceso histórico de la Construcción de la Torre de Urgencias al grupo veedor.	Consorcio Quirón e Interventoría.	Marzo/2023	X		
2						
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
1	1	100

DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.

- 1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Líder de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.

Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 6 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Jerónimo Sánchez, Miguel Murcia, Dora Benavides, Rosalba Peña y Eligio Rey. Byron Aguirre, Iván D. Samper, Cristian Rodríguez, Cristian Moreno y Francisco Barrios de la Interventoría, representando al consorcio Quirón Ing. Jairo Varela, Arq. Jorge Cue y Arq. Graciela Prieto. Ramiro Ortiz, Cristhian Rangel y Flor A. Vargas de la Secretaria Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente Dra. Martha Y. Ruiz Gerente de la entidad, Dra. Liliana M. Rodríguez Subgerente corporativa, Jefe Diana Mendivelso, Arq. Yasser Kalil, Ing. Julie Talero e Ing. Nicolás Albarracín de la Oficina de Desarrollo Institucional y de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano el profesional Daniel Sebastián Aponte.

- 2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de febrero para su respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el contenido de la misma.

- 3. RECORRIDO POR LA OBRA:**

El grupo veedor solicita realizar recorrido por la obra de la Torre de Urgencias para validar las adecuaciones e instalaciones de equipos que se vienen desarrollando. A su vez, detallar el piso 4 el cual ya se encuentra en su acabado final y listo para la entrega a la Subred. La Arq. Graciela Prieto guía el recorrido por la obra socializando los avances presentados a la fecha.

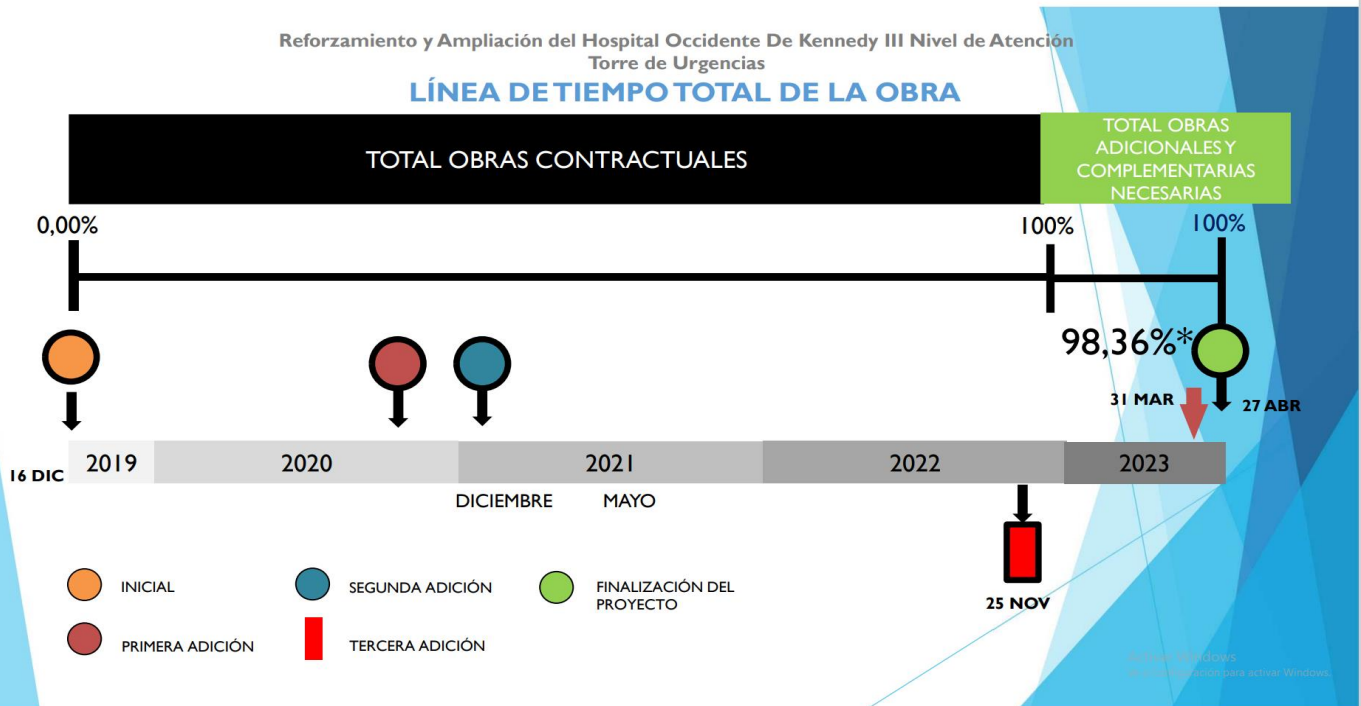


- 4. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:**

DESARROLLO

Toma la palabra, Francisco Barrios de la Interventoría para presentar los avances presentados en el último mes. En donde, se evidencia una ejecución del 98,30 % sobre un proyectado del 97,50% con una diferencia de 0.86%.

LÍNEA DE TIEMPO TOTAL DE LA OBRA:



* Porcentaje de avance correspondiente a las nuevas condiciones de obra contractuales V5.

ANTECEDENTES EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE KENNEDY:

ANTECEDENTES EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE KENNEDY

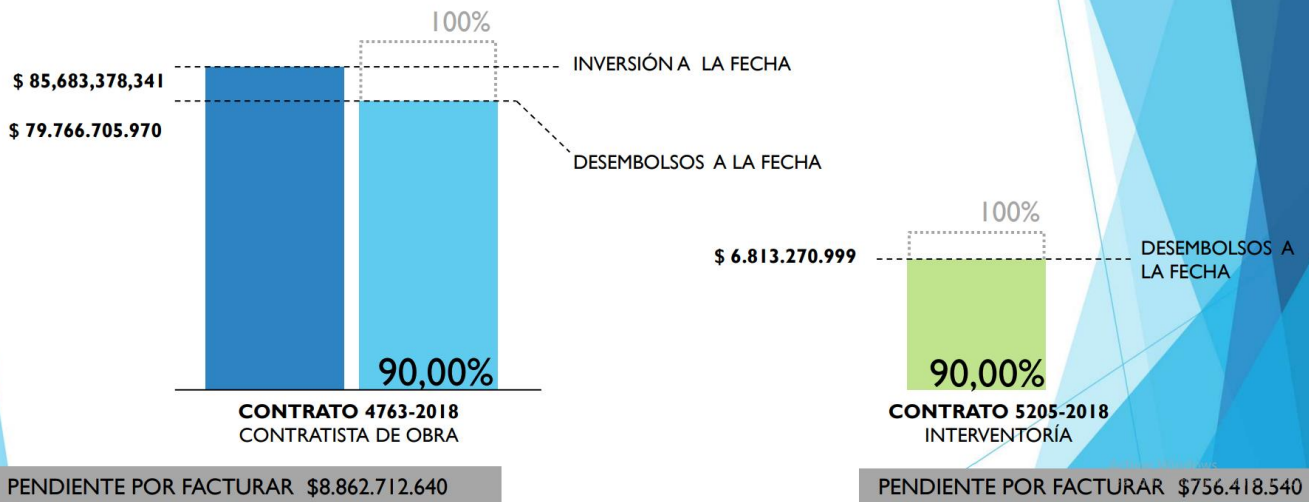
Objeto:	"Aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto denominado "Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención".		
	INTERVENTORIA	OBRA	TOTAL
CONTRATO INICIAL	\$ 2,990,000,000	\$ 31,999,999,999	\$ 34,989,999,999
(1) 24-11-2020	\$ 1,632,940,028	\$ 17,476,281,234	\$ 19,109,221,262
(2) 14-04-2021	\$ 3,306,569,146	\$ 38,673,323,345	\$ 41,979,892,491
(3) 25-11-2022	-	\$ 2,319,527,431	\$ 2,319,527,431
Valor actual del convenio:	\$ 7,929,509,174	\$ 90,469,132,009	\$ 98,398,641,183

DESARROLLO

COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS DESEMBOLSOS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS. DESEMBOLSOS ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA



Nota: Los pagos son autorizados de acuerdo al porcentaje de avance. El interventor cobra por avance estrictamente apegado a la modalidad de pago del constructor.

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

No.	ACTIVIDAD
1	INFRAESTRUCTURA CAMARAS TELEUCI - FASE I
2	EQUIPOS CAMARAS TELEUCI - FASE 2
3	SEMAFORO RAMPA
4	CONEXIÓN FIBRA OPTICA ENTRE EDIFICACIONES
5	CONEXION TANQUE DE GAS CRIOGENICO
6	RESTITUCIÓN RED PLUVIAL EAAB
7	SEÑALETICA
8	PREINSTALACIONES AUTOCLAVE
9	PREINSTALACIONES CABINA FLUJO LAMINAR
10	SOPORTES ESTACIONES SATÉLITES
11	PREINSTALACIONES ATRILES DIGITURNO
12	SALA MAXILOFACIAL
13	SALA DE YESOS
14	CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO
15	SALA DE REANIMACIÓN SEGUNDO PISO
16	SALA DE TRANSICIÓN
17	LAVADO DE MANOS OBSERVACIÓN HOMBRES
18	DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
19	CUARTO DE INSUMOS

No.	ACTIVIDAD
20	BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
21	ÁREA DE ASEO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
22	ÁREA DE EMPAQUE
23	ÁREA MATERIAL ESTERIL
24	ÁREA SUCIA
25	BICICLETEROS SÓTANOS
26	PORTONES VEHICULARES PARA SÓTANOS
27	RAMPA Y ESCALERAS ÁREAS TÉCNICAS
28	CUBIERTAS ACCESOS PEATONALES ZONA AMBULANCIAS
29	CERRAMIENTO MAPOSTERÍA CONTRA HOSPITAL EXISTENTE
30	ACABADOS AREAS ESPECIALES
31	CONTROL DE ILUMINACION
32	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CUARTOS ELECTRICOS

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

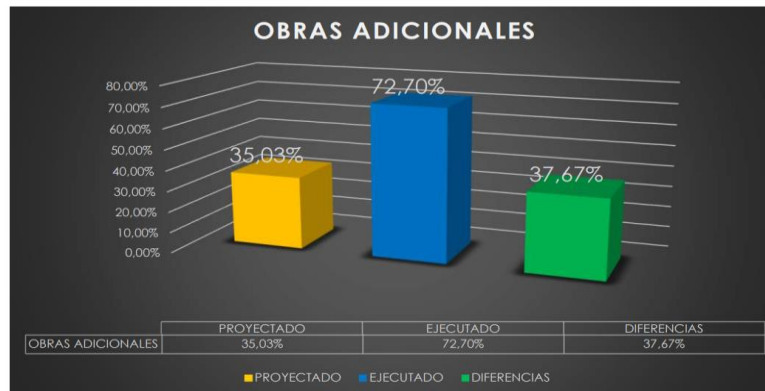
CINCO (5) MESES
A PARTIR DE LA FIRMA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

DESARROLLO

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Obras complementarias:

A la fecha se tiene un avance de las actividades correspondientes a obras complementarias equivalente proyectado del 35,03% en el cual se ha ejecutado un **72,70%**, por lo tanto, se tiene un avance positivo del **+37,67%** de acuerdo con la nueva programación de obra V5



Francisco Barrios expone el avance en relación a las obras complementarias las cuales tiene una proyección del 35,03% y una ejecución del 72,70% con una diferencia del 37,67%.

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

20221130PROGRAMACIÓN DE OBRA V5	PROYECTADO	EJECUTADO	EJECUCION
OBRAS COMPLEMENTARIAS	35,03%	72,70%	37,67%
INFRAESTRUCTURA CAMARAS TELEUCI - FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%
EQUIPOS CAMARAS TELEUCI - FASE 2	0,00%	30,00%	30,00%
SEMAFORO RAMPA	0,00%	20,00%	20,00%
CONEXIÓN FIBRA OPTICA ENTRE EDIFICACIONES	0,00%	90,00%	90,00%
CONEXION TANQUE DE GAS CRIOGENICO	0,00%	60,00%	60,00%
ADAPTACIÓN CONEXIONES DEFINITIVAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100,00%	100,00%	0,00%
SEÑALETICA	0,00%	20,00%	20,00%
PREINSTALACIONES AUTOCLAVE	100,00%	95,00%	-5,00%
PREINSTALACIONES CABINA FLUJO LAMINAR	100,00%	100,00%	0,00%
PREINSTALACIONES ESTACIONES SATELITE	0,00%	98,00%	98,00%
PREINSTALACIONES ATRILES DIGITURNO	100,00%	100,00%	0,00%
PREINSTALACIONES MONITORES Y PANTALLAS DIGITURNO	100,00%	100,00%	0,00%

DESARROLLO

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

20221130PROGRAMACIÓN DE OBRA V5	PROYECTADO	EJECUTADO	EJECUCION
SALA MULTIFUNCIONAL (CONSULTORIO MAXILOFACIAL)	0,00%	80,00%	80,00%
SALA DE YESOS - LAVADO DE MANOS	100,00%	85,00%	-15,00%
PREINSTALACIONES CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO	100,00%	100,00%	0,00%
SALA DE REANIMACIÓN SEGUNDO PISO	0,00%	60,00%	60,00%
SALA DE TRANSICIÓN	0,00%	65,00%	65,00%
LAVADO DE MANOS OBSERVACIÓN HOMBRES	100,00%	50,00%	-50,00%
PREINSTALACIONES DESINFECCIÓN EQUIPOS	100,00%	90,00%	-10,00%
PREINSTALACIONES CUARTO INSUMOS	100,00%	75,00%	-25,00%
PREINSTALACIONES BAÑOS PMR	0,00%	85,00%	85,00%
ÁREA DE ASEO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0,00%	0,00%	0,00%
PREINSTALACIONES ÁREA DE EMPAQUE	0,00%	15,00%	15,00%
PREINSTALACIONES MATERIAL ESTERIL	100,00%	53,00%	-47,00%
PREINSTALACIONES AREA SUCIA	100,00%	0,00%	-100,00%
BICICLETEROS SÓTANOS	0,00%	0,00%	0,00%
PORTONES VEHICULARES PARA SÓTANOS	0,00%	0,00%	0,00%
RAMPA Y ESCALERAS ÁREAS TÉCNICAS	0,00%	30,00%	30,00%
CUBIERTAS ACCESOS PEATONALES ZONA AMBULANCIAS	0,00%	5,00%	5,00%
CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA CONTRA HOSPITAL EXISTENTE	0,00%	61,00%	61,00%
ACABADOS ÁREAS ESPECIALES	0,00%	100,00%	100,00%
CONTROL DE ILUMINACIÓN	100,00%	100,00%	0,00%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CUARTOS ELÉCTRICOS	100,00%	100,00%	0,00%
FIN OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00%	0,00%	0,00%

La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, Diana Mendivelso, expone que se realizará una revisión a las alertas, en relación a la conexión de gases medicinales con la Dirección de Servicios Complementarios para agilizar esta actividad. Agrega que las entidades han estado constantemente articuladas para validar los procesos de entrega de cada uno de los pisos de la torre de urgencias y así iniciar el ingreso a la edificación. Margarita Arévalo, solicita que se informe al grupo veedor los días de entrega de equipos para realizar veeduría ciudadana a esta acción.

5. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Margarita Arévalo pregunta ¿cómo avanza la entrega de los computadores? La Dra. Martha Y. Ruiz indica que ya se cuenta con todos los equipos y se avanza en el proceso de conexión de fibra óptica.

Margarita Arévalo pregunta ¿cómo avanza el mejoramiento del sistema de información? y ¿ya iniciaron las obras de conexión física con la torre actual? La Dra. Martha Y. Ruiz expone que se aumentó el número de procesadores de 10 a 32, esto con el fin de incrementar la capacidad de información, agilizando la conexión a internet, proceso que se realiza en conjunto con la ETB. Sumado a ello, se actualizó el equipo tecnológico encargado de recibir la información. La Dra. Liliana M. Rodríguez Subgerente corporativa, agrega que, se avanzó en la conexión tecnológica con la torre actual y se espera finalizar para la tercera o cuarta semana de abril. En relación a la conexión física de la torre se espera que para la tercera semana de abril se entregue para finalizar el proceso.

Eligio Rey agradece la gestión de las instituciones y las partes involucradas por los resultados evidenciados mes a mes en relación a la Torre de Urgencias del Hospital Occidente de Kennedy.

Margarita Arévalo pregunta ¿Qué respuesta brindó la alcaldía local de Kennedy frente al arreglo de la vía y el tema de los vendedores ambulantes? La Dra. Martha Y. Ruiz recalca que la entidad está en completa disposición para facilitar estos procesos locales para validar estas actividades, solicita el apoyo por parte de la comunidad para convocar a las entidades responsables y establecer una mesa de trabajo. A su vez, se

DESARROLLO

pueden articular con la Oficina de Participación para validar esta situación y programar el encuentro con la Alcaldía Local de Kennedy, Personería y Policía Nacional.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Daniel Aponte convoca a las partes a la próxima reunión pactada con los asistentes para el 27 de abril de 2023 a las 8:00 am.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:00 am.



FECHA: 31 de marzo de 2023

TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Apoyar el proceso de articulación entre los veedores y las instituciones locales para facilitar una mesa de trabajo.	Oficina de Participación Comunitaria	Abril/2023

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competen

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</p>	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponde

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____



Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____











FECHA: 31-03-2023. (dd-mm-aaaa) LUGAR: T. Urgencias Kennedy HORA INICIO: 8:00 am.

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria. (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 10:00 am.

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión de avances con el grupo asesor.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	19121539	Miguel Herrera	H Kennedy	Torre Kennedy	Vecedora	[Firma]
2	51'6108914	Dora Ruth Buitrago	H Kennedy	Torre Kennedy	Vecedora	[Firma]
3	17150038	Fernando Sandoz	H Kennedy	Torre Kennedy	Vecedora	[Firma]
4	52837463	Martha Yolanda Ruiz	Subred S.O.	Directoría de Entología	Gerente	[Firma]
5	52468234	Diana Mendivelso	SISSSO	Dpto. Inst.	Jeefe de A	[Firma]
6	33 369 418	Alicia Parra Rodriguez	SISSSO	Sub Corporativ	Subgerente	[Firma]
7	1015410366	Julie Routine Talaro H	SISSSO	Dpto. Institucional	Ing. Biomedica	[Firma]
8	80122 604	Yasser Kaul	SISSSO	Dpto Inst	Coordinador	[Firma]
9	1233491360	Cristian Rodriguez	Interventoria	Interventoria	Ing. Air. Infra	[Firma]
10	80208215	Ivan Dario Samper	Interventoria	Interventoria	Ing. Apoyo	[Firma]
11	51884099	Flo Angelo Vargas	SOS	Control Social	Prox Un.	[Firma]
12	4115374125	Mosalberto Pardo	H. Kennedy	Torre Kennedy	Vecedor	[Firma]

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17-11-2021	
		Código:	02-01-F0-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	7938246	Bryan Navire D.	INTERVENCIÓN OBRA		INC. LEJIO. INTERV.	
14	100958208	Ernstun Navarro	Intervención Obra		participante	
15	19130088	Eligio Mejía	INTERVENCIÓN		INTERVENC.	
16	79151498	JOSE CUBA	QUIRÓN ABD.	DIESTRO ABD.		
17	79500535	Ramiro Ovchi M	S.D.S. Infraest. y T.	Infraest. y Tecnología	Prof Esp.	
18	91.09920	Cristhian Rangel D.	DIT. 203	Infraestructura Detección	Ingeniero	
19	19230995	Jairo E Varela F.	C Quirón	obra.	PL	
20	52103918	Graciela Puerto	C Quirón	DIT. obra	obra	
21	1013670147	David Aparicio	JUR.	PCSC	Lider	
22	51613585	Margarita Alvarado	NOSP. Kennedy	obra Kennedy	conducirse	
23						
24						
25						
26						
27						
28						
