

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	2	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3-05-2018	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda Acta de Subred ☒ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ☐ Acta de Sede de una Unidad ☐ Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____ Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____		
Tipo de acta COMITÉ ☐ REUNIÓN ☒ OTRO ☐		NÚMERO DE ACTA: 01
FECHA: 02 de febrero de 2024	LUGAR: Salón segundo piso Hospital Occidente de Kennedy	HORA INICIO: 8:00 am
RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano		HORA FINAL: 9:30 am

OBJETIVO DE LA REUNION Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances del Hospital Occidente de Kennedy
--

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)	
1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra Hospital Occidente de Kennedy
4.	Intervención de los Veedores
5.	Proposiciones y Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Convocar al Consorcio e Interventoría encargados de la ejecución de la obra.	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	02 de febrero de 2024	X		
2	Formulación del proyecto de la segunda fase del Hospital Occidente de Kennedy para presentarlo al banco de proyectos del distrito.	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Diciembre de 2024	X		
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
2	2	100

DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Líder de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances del Hospital Occidente de Kennedy.

Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 4 veedores de la obra, Rosalba Peña, Margarita Arévalo, Miguel Murcia y Eligio Rey. Por parte de la Subred Suroccidente Dra. Martha Y. Ruiz Gerente de la entidad, Jefe Diana Mendivelso, Arq. Yasser Kalil, Arq. Darío Macías de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, el profesional Daniel Sebastián Aponte Líder de Control Social de la Oficina de Participación Comunitaria y Flor Ángela Vargas Ref. de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud. A su vez, Laura Cardozo, Paola Guerra, Bernardo Gil y José M. Galeano de la Interventoría, Mónica Molina y Laureano Cuadros del Consorcio Unidad de Kennedy.

- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El profesional de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de noviembre para su respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el contenido de la misma.
- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY:** Toma la palabra, Mónica Molina para socializar los datos generales del contrato a los asistentes:

DATOS GENERALES CONTRATO ADECUACIONES:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO ADECUACIONES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO UNIDAD DE KENNEDY
NUMERO DEL CONTRATO:	4702-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY.
VALOR EL CONTRATO:	\$7.952.163.062 \$92.693.035 Diagnóstico \$7.859.470.027 Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 meses
FECHA DE INICIO:	17 de julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	14/10/2023 al 14/11/2023 (32 días)
SUSPENSIÓN 2:	15/11/2023 al 21/11/2023 (7 días)
SUSPENSIÓN 3:	22/11/2023 al 30/11/2023 (9 días)
REINICIO:	01 de diciembre de 2023
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	05 de diciembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 de agosto de 2024

Yasser Kalil indica que el resultado del diagnóstico, se identificó que el tema de redes no era muy claro para la respectiva adecuación y no se pudo levantar la información precisa en el tiempo especificado. Por tal razón, hasta no aclarar este tema se tuvo que hacer una suspensión del contrato.

DESARROLLO

DATOS GENERALES CONTRATO ASCENSORES:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO ASCENSORES

CONTRATISTA OBRA:	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L SAS
NUMERO DEL CONTRATO:	5374-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY
VALOR EL CONTRATO:	\$990.080.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 meses
FECHA DE INICIO:	17 de julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	17 de agosto de 2023
REINICIO:	02 DE OCTUBRE
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de Abril de 2024

Yasser Kalil expone a los asistentes que se tuvo una suspensión en el contrato de los ascensores por falta de información en la etapa de diagnóstico. Adicional, en el momento que llegaron los equipos a puerto no pudo salir a tiempo por temas administrativos con la DIAN. Por ende, hasta que no solucionó este trámite no se pudo hacer el traslado de los ascensores al Hospital Occidente de Kennedy. La Dra. Diana Mendivelso recalca que fue un tema netamente de la DIAN y la Subred Sur Occidente no tuvo la responsabilidad en el atraso del arribo de los equipos.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO


INTERVENTORÍA OBRA:	CONSORCIO INTERSALUD KENNEDY
NUMERO DEL CONTRATO:	4701 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY Y DE LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY."
VALOR EL CONTRATO:	\$ 694.270.161
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	17 de Julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	14 de octubre de 2023
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
REINICIO:	15 de Noviembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 de julio de 2024

DESARROLLO

¿QUÉ SE VA A INTERVENIR?

¿QUE SE VA A INTERVENIR?


PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE ÁREAS USS KENNEDY ADECUACIONES CON FINES DE HABILITACIÓN – MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y CONDICIONES DE SERVICIO

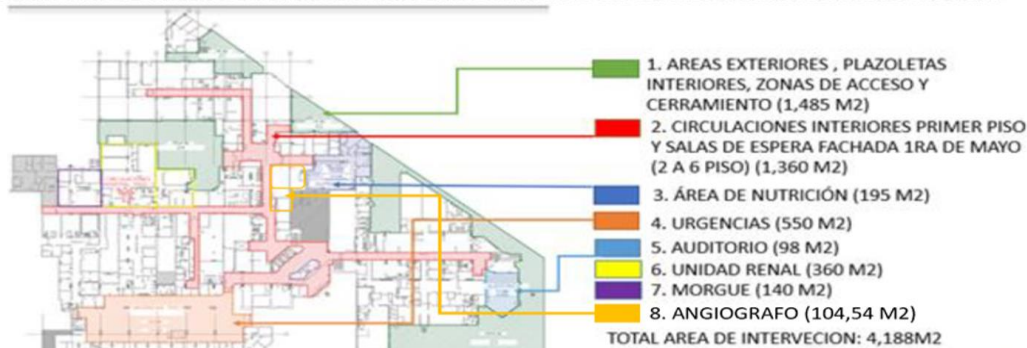

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

El Arq. Javier del Consorcio Unidad de Kennedy indica que el contrato está dividido en dos etapas: La primera etapa, denominada de Etapa de Diagnóstico y preliminar de adecuación, tiene como objetivo principal determinar, sobre la base de lo preliminarmente evidenciado por la Subred, el estado de la infraestructura y las intervenciones necesarias para poder establecer el alcance las condiciones técnicas necesarias, para poder desarrollar con éxito la segunda fase. Agrega, que la segunda Etapa, se denomina etapa de adecuación e intervención de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy todo ello apoyado desde el área técnica del consorcio.

PROPUESTA ANGIÓGRAFO:

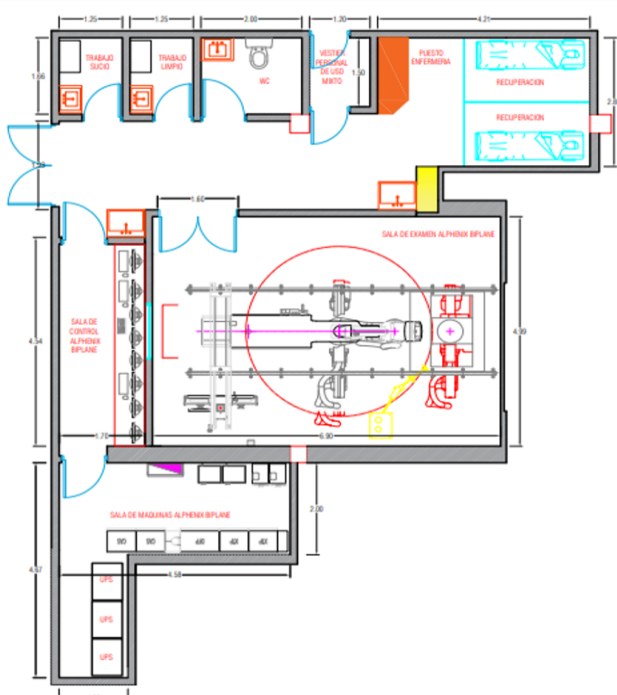

PROPUESTA DE ANGIÓGRAFO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

DESARROLLO

Darío Macías indica que avanza en un 70% la demolición de la futura área de Angiografía. A su vez, informa que la adjudicación del equipo quedó con la empresa CANON y ya se está revisando todo lo que compete el tema de conexiones. Adicional, recalca que el equipo (Angiógrafo) trabajará de forma independiente sin afectar las condiciones del edificio. Agrega, la Dra. Diana Mendivelso que, la Subred Sur Occidente hizo énfasis al consorcio e interventoría en validar un espacio para prestar el servicio de Angiografía, sin que este vaya a afectar la estructura del edificio y los servicios que se prestan alrededor.

AVANCES PRESENTADOS A LA FECHA:

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Cerramiento de ascensores de carga de piso 1 a piso 6



Cerramiento de ascensores zona salas de espera de piso 1 a piso 6



Demolición de vanos de ascensores de carga- ampliación de vanos.

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Desmonte de estructura de cielo raso angiografo.



Desmonte de superboard cielo raso angiografo



¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Demolición de piso angiografo.

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Demolición de mampostería y ampliación de vanos de ascensores.



Adecuación de zona de campamentos de obra.



Aseo de foso de ascensores.

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Extracción de muestras de suelo para ensayos zona plazoleta de acceso almacén



Extracción de muestras de suelo para ensayos zona plazoleta de acceso almacén



Adecuación de senderos para accesos de personal del hospital.

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Excavación de viga para instalación de cerramiento



Excavación de viga para instalación de cerramiento



Instalación de anclajes para mantenimiento y de fachadas.

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Actividades de demolición para instalación de portón de comunicación plazoleta urgencias y plazoleta unidad renal.



¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Levantamiento topográfico área plazoleta unidad renal.



Desmonte de cerramiento exterior.

DESARROLLO

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Adequación de rutas de acceso personal hospital



Actividades de mantenimiento de fachadas



Cerramiento plazoleta unidad renal

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Obra civil para cerramiento perimetral

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE SST



señalización de paso peatonal y cerramiento de la parte de vegetación



¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE SOCIAL: Información a la comunidad



Socialización y entrega de volantes informativos a usuarios en salas de espera, unidad renal y entrada al hospital

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE SOCIAL: Información a la comunidad



Publicación de piezas informativas



¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE SOCIAL: Levantamiento de actas de vecindad



Áreas externas



Áreas internas

Mónica Molina indica que se cuenta con una Oficina de atención al Usuario ubicada en el costado sur occidental del hospital, antigua zona de urgencias, en el horario de lunes y miércoles de 02:00 p.m a 04:00 p.m y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. A su vez, se tiene un correo electrónico: hospitalk2023social@gmail.com y un número de celular (3175462010) para cualquier inquietud que remita la ciudadanía.

Bernardo Silva del consorcio Maquinas Procesos y Logística M P & L SAS, toma la palabra para socializar los avances que se vienen presentando a la fecha en el contrato de ascensores del Hospital Occidente de Kennedy, el cual tiene un 35% de ejecución con una fecha de entrega prevista para el 01 de abril 2024.

A continuación, presenta a los asistentes las actividades adelantadas a la fecha:

DESARROLLO

AVANCES PRESENTADOS A LA FECHA:

CONTRATO DE ASCENSORES




Delimitación de acceso a ascensor No. 4. Construcción de confinamiento

CONTRATO DE ASCENSORES




INSTALACION DE 4 EQUIPOS NUEVOS , 6 PARADAS

CONTRATO DE ASCENSORES



Desmantelamiento del sistema de contrapeso ascensor No. 4

CONTRATO DE ASCENSORES



Desmante de sistema de rieles guía y soportes de ascensor No. 4

CONTRATO DE ASCENSORES



Retiro de cables de tracción de ascensor No. 4

CONTRATO DE ASCENSORES



Desmantelamiento de cabina de ascensor No. 4

CONTRATO DE ASCENSORES



Desmantelamiento de máquina de ascensor No. 4

CONTRATO DE ASCENSORES



Construcción de encerramiento de área de ascensor No. 1


DESARROLLO

CONTRATO DE ASCENSORES




Recibo y traslado de nuevos ascensores al lugar de acopio

CONTRATO DE ASCENSORES



Desensamble de soportes y rieles guía y accesorios , ascensor No. 1

CONTRATO DE ASCENSORES

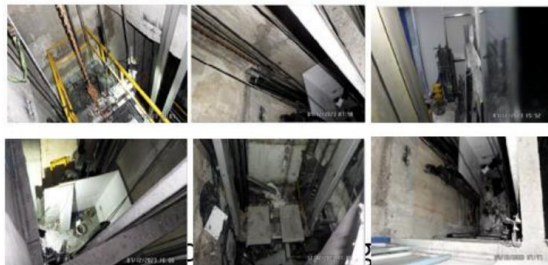

Desmantelamiento de cabina de ascensor No. 1

CONTRATO DE ASCENSORES



Desensamble y retiro de Maquina de ascensor No. 1

CONTRATO DE ASCENSORES




Preensamble y alistamiento de componentes de ascensor No. 4 y No. 1

CONTRATO DE ASCENSORES



Se instalan soportes y rieles guía en foso ascensor No. 4

CONTRATO DE ASCENSORES



Ensamble de marco de cabina y plataforma (piso) ascensor No. 4

CONTRATO DE ASCENSORES



Instalación de soportes y rieles guía sección superior ascensor No. 1 y No.4

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	2	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3-05-2018	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Margarita Arévalo agradece la presentación socializada el día de hoy y felicita al consorcio e interventoría por los avances presentados a la fecha. A su vez, solicita a las partes, minuta de los contratos con el consorcio e interventoría, propuesta de inversión total del proyecto y copia del convenio establecido para el desarrollo de las actividades de adecuación y cambio de ascensores del Hospital Occidente de Kennedy. Adicional, indica que es importante que en la próxima reunión se exponga el avance financiero del proyecto.

La Dra. Diana Mendivelso aclara que el convenio se tiene estipulado con la Secretaría Distrital de Salud y de allí se derivan tres (3) contratos en los cuales se estipulan el tema de adecuaciones, ascensores e interventoría. Agrega que se enviará la documentación solicitada al grupo veedor, a través de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur Occidente.

Eligio Rey expone que es necesario que en la próxima reunión se realice recorrido por los diferentes puntos de obra para validar los avances presentados por el consorcio e interventoría.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- La Dra. Diana Mendivelso informa al grupo veedor que dando cumplimiento al compromiso pactado la vigencia 2023, se radicó ante la Secretaría Distrital de Salud el anteproyecto correspondiente a la fase 2 del proyecto denominado "Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención".
- Flor Á. Vargas indica que se va a realizar una actualización de la resolución de la veeduría, en mención al objeto de control social y los integrantes.
- Daniel Aponte convoca a las partes a la próxima reunión pactada con los asistentes para el 01 de marzo de 2024 a las 8:00 am.

Se da por terminada la reunión siendo las 9:30 am.

FECHA: 02 de febrero de 2023	TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy
------------------------------	--

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envío al grupo veedor de la minuta de los contratos con el consorcio e interventoría, propuesta de inversión total del proyecto y copia del convenio establecido para el desarrollo de las actividades de adecuación y cambio de ascensores del Hospital Occidente de Kennedy.	Oficina de Participación Comunitaria y Oficina de Desarrollo Institucional.	Febrero de 2024

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competen

ACTA

Versión: 2
Fecha de aprobación: 3-05-2018
Código: 02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 3 Fecha de aprobación: 17-11-2021 Código: 02-01-F0-0002	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	--	--	----------------------------------

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred ☒ Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 02-02-2024. LUGAR: Hospital OCC - Femenid. HORA INICIO: 8:00 am.

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 9:30 am

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión con los vendedores del Hospital de Femenid.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	179506792	Dario Macias	SESSO	Dpto. INST.	Supervisor Contacto	[Firma]
2	80122604	Yessy Kaul	SESSO	Dpto. INST.	Coor	[Firma]
3	1120752743	Maria Monica Molina	Contratista	Reinforcid	Prof. Social	[Firma]
4	53154858	Laura Cardozo	Prof. Social	Interventoria		[Firma]
5	1024532636	Paula Guevara	Interventoria	Interventoria		[Firma]
6	80031.322	Jose M. Galeano V.	Interventoria		Director	[Firma]
7	80032.434	Bernardo Gil	Interventoria	Interventoria	Director ASC.	[Firma]
8	1010219645	Leidy Silva	Arquitecta-Interventoria	Interventoria	Arquitecta Apoyo	[Firma]
9	51681096	H. Angel Vargas	SOS	Control Social	Profesor Univer	[Firma]
10	17641246	Guillermo Cuadros	Contratista Montessori	Contratista	Director Obra	[Firma]
11	1913008	Elvira Pizarro	Vendedora	Control	0324	[Firma]
12	41537745	Rosalba Pizarro	Vendedora	Control	Vendedora	[Firma]

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES Versión: 2 Fecha de aprobación: 18-04-2018 Código: 02-01-F0-0002 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL
13	67837463	Martha Yvonne Ruiz	Subred SO	Estadística	Gerente
14	52469234	Diana Mendivele	Subred SO	Dpto Int	Jefe de C4
15	6760482	Edwin E. Gutiérrez	ASD KENNEDY		Secretario
16	19171539	Manuel García	Vendedor		Vendedor
17	101307047	David S. Aponte	SOC.	PCSC	Lider.
18	53.61358	Margarita Arzulo	Kennedy	Vendedor	coordinador
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
