

	ACTA	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14-01-2020	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

asistentes se relacionan en el listado de asistencia que se anexa a la presente acta. Para esta sesión se realiza la presentación de cada uno de los asistentes y su rol en la mesa y en la entidad correspondiente.

2. Aprobación de acta anterior: El profesional de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de marzo para su respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el contenido de esta.

3. Socialización equipo metro de Bogotá: El señor Fredy Cañón refiere que, dentro de los avances en la primera línea de metro de Bogotá, el porcentaje es del 50%, indica a los asistentes que deseen con mayor profundidad información, el día 06 de mayo del presente año, se llevara a cabo una reunión en Santa Marta Pastrana a las 2:00p.m.

- El señor Eligio Rey pregunta ¿cómo quedará el frente del hospital?, teniendo en cuenta que se encuentra una de las obras detenidas, debido a que no se sabe hasta dónde llega la construcción del metro. Fredy Cañón por otra parte aclara el tema en cuanto al frente del Hospital Occidente de Kennedy, los límites con el metro, en reuniones pasadas en el año 2024, fue demarcada y delimitada con pintura azul, la zona hasta donde será la intervención del metro; dando un parte de tranquilidad a la ciudadanía en cuanto a los límites y que no se realizará ningún tipo de intervención por parte del metro en el frente o infra estructura del Hospital Occidente de Kennedy. Aclarando que, debido a las construcciones y adecuaciones en la vía, se deben hacer cierres temporales, con el fin de siempre contar un paso vial, tanto vehicular como peatonal. De manera anticipada se avisan los cierres sin afectar con mayor impacto a la ciudadanía. Refiere también que la cicloruta se correrá al centro de la vía, es decir al costado de la infraestructura del metro, por tal razón debe realizarse primero dicha obra antes de intervenir el andén o donde actualmente se encuentra la ciclo ruta.
- El señor Ramiro indaga sobre la parte ambiental del metro; el señor Fredy Cañón indica que la zona verde, es el último paso en la construcción y de acuerdo a las obras, este espacio puede cambiar, sin embargo, asegura que sí, tendrá zona verde y respondiendo también a la inquietud de la señora Margarita y el señor Eligio, el metro si se ajustara a las necesidades ambientales del Hospital Occidente de Kennedy, en temas de zona verde, ruido y vibración. Y reitera que la parte de consulta externa no será intervenida. Todo de acuerdo a los límites demarcados.
- El señor Eligio Rey, luego de la aclaración del señor Fredy Cañón, en cuanto a los límites y la construcción del metro en frente del hospital y reiterando la no afectación en la infraestructura del hospital, agradece la asistencia de las personas de la interventoría y construcción de la primera línea del metro de Bogotá.
- La señora Margarita Arévalo, expresa precisamente que esa era la intención de la invitación a la mesa y veeduría de la obra del Hospital de Kennedy.
- Fredy Cañón retoma y es reiterativo en informar los límites de construcción, los cuales se respetan y sustenta que ambientalmente el metro es auto sostenible, debido a las redes secas y subterráneas.
- El señor Eligio Rey indica que ya teniendo el conocimiento de la intervención del frente del hospital será hasta la cicloruta sin afectar la infraestructura del Hospital, es posible continuar con las adecuaciones del mismo, y seguir con la obra que por desconocimiento se encontraba parada.
- El ingeniero Fabián pregunta quien tiene los planos de los límites demarcados en su momento, con el fin de saber los puntos exactos de intervención.

4. Socialización avances de la obra Hospital Occidente de Kennedy: Dando continuidad a la sesión, el consorcio Unidad de Kennedy brinda los datos sobre los avances en la obra:


DESARROLLO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE ADECUACIONES

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO UNIDAD DE KENNEDY
NÚMERO DEL CONTRATO:	4702 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY
VALOR EL CONTRATO:	\$ 7.852.163.062
	\$ 92.886.035 Diagnóstico
	\$ 7.809.470.027 Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	17 de julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	14 de octubre de 2023
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	14 de Noviembre de 2023
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:	27 de Noviembre de 2023
REINICIO 1:	5 de Diciembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de julio de 2024
PRÓRROGA 1:	14 de agosto de 2024 a 14 de septiembre de 2024
SUSPENSIÓN 2:	03 de septiembre de 2024
REINICIO:	10 de septiembre de 2024
PRÓRROGA 2:	10 de SEPTIEMBRE DE 2024 a 18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE DICIEMBRE 2024
SUSPENSIÓN 3:	17 DE DICIEMBRE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3:	23 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
REINICIO:	02 DE ABRIL 2025
ADICIÓN 1:	\$ 4.802.348.881
VALOR TOTAL:	\$ 12.754.511.943,00
PRÓRROGA 3:	5 MESES
NUEVA FECHA FINALIZACIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

¿QUE SE VA A INTERVENIR?

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE ÁREAS USS KENNEDY ADECUACIONES CON FINES DE HABILITACIÓN – MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y CONDICIONES DE SERVICIO

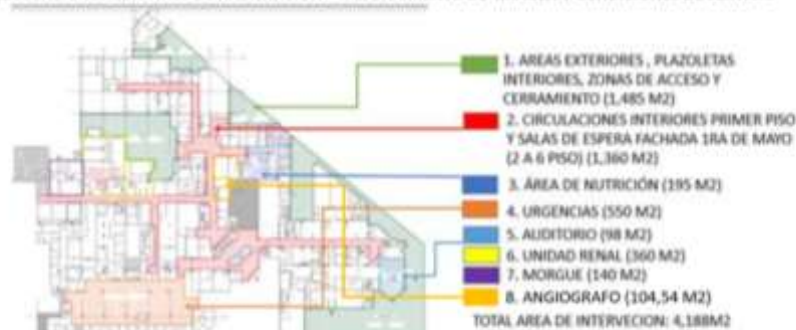

La persona expositora del consocio, refiere que se realizó firma de la adición y prórroga del contrato el día 02 de abril del 2025

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión: 3		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 14-01-2020		
		Código: 02-01-F0-0001		

DESARROLLO

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

AVANCE DE OBRA
PROGRAMADO 59,37 %

EJECUTADO 57,19 %

ATRASO 2,18%
Contrato activo



CONTROL FINANCIERO

CONTRATO 4702-2023 - ADECUACIONES	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.754.511.943,00
PAGOS	
1. PAGO CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICO:	\$ 92.893.039
2. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 2	\$ 890.362.950
3. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 3	\$ 352.871.582
4. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 4	\$ 535.786.381
5. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 5	\$ 941.202.280
6. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 6	\$ 851.136.078
7. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 7	\$ 456.808.837
8. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 8	\$ 754.526.540
9. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 9 (En trámite)	\$ 664.028.199
VALOR EJECUTADO	\$ 5.544.305.482,00
SALDO POR COBRAR	\$ 7.210.206.461,00

Avance financiero 43,47% con corte de obra a Abril 20 de 2025



 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14-01-2020	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO



Inicio de actividad de mantenimiento fachada Diagonal 40 A sur- Retiro de grafitis



En cuanto a la intervención de la fachada, se explica la complejidad que ha sido remover dicha pintura y los resanes que se han debido hacer y que aún se vienen realizando. De manera que varios de los veedores como lo son la señora Margarita, el señor Eligio y el señor Ramiro, refieren en común acuerdo que se evalúe la aplicación de pintura anti grafitis y la Dra. Viviana Cubillos, apoya la moción refiriendo que se brinde como un valor agregado en caso de que el insumo sea muy costoso y no se pueda contar dentro del presupuesto. La persona del consorcio, informa que será evaluada la sugerencia y se comunicará. El Coordinador de la Oficina de participación Comunitaria Daniel aponte, invita a la comunidad apropiarse de su Hospital Kennedy y mediante mesas de dialogo, se exhorta a cuidar la fachada y demás recursos.

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE TÉCNICO




Actividades de posventas en ductos de fachadas plazoleta tanque de oxígeno.



La señora Margarita, indaga sobre los ductos expuestos en la imagen, refiriendo que son ductos que no hacen parte de la fachada del Hospital. El Ing. Fabio indica que son ductos de las UCI, sin embargo, no está seguro e indica que se verificará. La señora Margarita, informa que son ductos que fueron instalados durante la pandemia por temas de atención y ampliación de servicios. Pero que hoy en día, no tienen que ver con UCI y que deben ser retirados, ya que no es estético y no pertenecen a la fachada.

De manera que el consorcio se compromete, al igual que los Ingenieros por parte de la Subred a consultar y específicamente investigar las funciones de dichos ductos y si es posible retíralos.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14-01-2020	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

Por parte del señor Ramiro, se indica que es importante tener presente y contemplar la red de incendios. El consorcio explica que, para la red de incendios, se debe tener en cuenta la infraestructura del edificio, ya que no es moderna, diferente a las adecuaciones que se vienen realizando, y por lo tanto cuenta con dicha red de incendios como seguridad.



Debido a los trabajos que se llevan a cabo al exterior, es necesario cerrar ventanas, como modo de protección a los usuarios, además se protege por medio de plásticos la propagación del polvo que se puede generar a causa de los trabajos.

La señora Margarita, pregunta sobre el aire acondicionado, y solicita verificar el cerrar las ventanas, ya que, de se sabe que en el servicio de UCI y aislamiento no se deben abrir ventanas. Por tal razón el aire acondicionado debe estar en normal funcionamiento, así mismo la calefacción o lo necesario para los usuarios y evitar abrir ventanas.

El señor Ramiro, indica que se debe realizar un recubrimiento. Por lo anterior se explica la manera en que se protege con plásticos evitando la propagación del polvo.



 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14-01-2020	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE SOCIAL

INFORMACIÓN:





Socialización a usuarios y funcionarios previo a inicio de labores.






Desde el componente social se informa que se han socializado a los vendedores ambulantes, usuarios, familiares y funcionarios con el fin de enterar a la comunidad en general de la intervención que se lleva a cabo a los alrededores del Hospital y su interior. Evitando accidentes y generando conciencia en las personas.

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE SOCIAL

DIVULGACIÓN:



APOYO AL ÁREA TÉCNICA:



Ubicación de avisos de sensibilización.

Registro fotográfico reparaciones en pasillo piso 2.






 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14-01-2020	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY

CONTRATO No. 5374-2023









DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE ASCENSORES

CONTRATISTA OBRA:	MACLANAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L SAS
NUMERO DEL CONTRATO:	5374-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY
VALOR EL CONTRATO:	\$990.080.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 meses
FECHA DE INICIO:	17 de julio de 2023
SUSPENSIÓN I:	17 de agosto de 2023
REINICIO:	02 DE OCTUBRE
FIN DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
FECHA DE PRORROGA:	01 de Abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de junio de 2024



En cuanto al contrato de los ascensores, es un contrato que se encuentra en liquidación, se culminó al 100% y se dio entrega de los ascensores para que hagan parte de los activos fijos del hospital.

	ACTA		Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			Fecha de aprobación:	14-01-2020	
			Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

RELACIÓN DE PAGOS


CONTRATO 5374 – 2023 -ASCENSORES	
VALOR DEL CONTRATO	\$990.080.000,00
PAGOS:	
1. LLEGADA Y DESPACHO ASCENSORES	\$ 396.032.000,00
PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%:	
2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	\$ 495.040.000,00
PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%:	
3. SALDO POR PAGAR :	
Correspondiente al 10% de liquidación:	\$ 99.008.000,00
VALOR EJECUTADO (100%)	\$990.080.000,00

* Avance financiero 90%

* 10% restante se cobrará una vez se suscriba el acta de liquidación







Teniendo presente o expuesto, por parte de la veeduría se solicita se indiquen con tiempo anticipado las fechas en las cuales se interviene la parte eléctrica y así por parte de la Subred, tomar acciones y planes de contingencia, garantizando el servicio de manera adecuada.

5. Intervención grupo veedor Intervención grupo veedor: Dando continuidad a la sesión, se da la palabra al grupo de veedores.

- La Sra. Margarita Arévalo solicita se pueda informar con anticipación cuando se inicia las obras frente al Hospital, ya que afecta a la comunidad en general y específicamente a los usuarios, familias y colaboradores por tal razón es importante contar con un plan de contingencia que no impacte de manera negativa a las personas que ingresan o salen del Hospital. Por otra parte, también refiere que se debe tener muy presente a la hora de las entregas todo el tema estructural, evidencio un desnivel en Urgencias y solicita se verifique.
- El señor Eligio Rey, expone la importancia de los baños cerca al auditorio principal, ya que en la última reunión evidencio que era un tema complejo; quedan muy lejos, solicita se verifique.
- El Ing. Fabio Aponte responde a la inquietud del señor Eligio, informando que al finalizar las adecuaciones y obras pertinentes los baños quedaran cerca al auditorio como corresponde.
- Tanto la señora Margarita como el señor Eligio concuerdan en que el auditorio se debe recuperar. Por lo anterior el Ing. de la interventoría, refiere que el auditorio hace parte de las intervenciones que se realizaran, por tal razón el auditorio quedara en óptimas condiciones, teniendo en cuenta que el presupuesto de mantenimiento y no readecuaciones; de manera que la señora Margarita, expone que si es necesario, para no aumentar costos, ya que el presupuesto es finito y tampoco aumentar tiempos de entrega, la subred cuenta con trabajadores oficiales que pueden realizar dichos trabajos para el auditorio.
- Los veedores también preguntan sobre la puesta en marcha del angiógrafo, y se pide se explique cómo será la labora frente al tema. El consorcio informa que no se detendrán las actividades en los otros puntos, simplemente se tendrá un mayor esfuerzo en el angeo grafo sin descuidar las otras ejecuciones dentro del contrato, haciendo énfasis en que la entrega se hará dentro de lo establecido.
- La señora Margarita Arévalo, refiere en cuanto al presupuesto que se debe solicitar más de lo requerido para lograr acceder a los necesario, de manera que se el presupuesto alcance para culminar de manera satisfactoria el proyecto. Y solicita a la interventoría, realizar los estudios previos y que sean lo más preciso posible para saber qué hace falta y cuanto presupuesto se necesita. Hablando del presupuesto que son 12 mil millones de pesos, sin embargo, el Ing. De la SDS, informa que el presupuesto real es de 19 mil millones de pesos.
- Said Lozano expone que la próxima reunión se desarrollará el día 30 de mayo de 2025 a las 8:00 am.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:40 am.

FECHA: 25 de abril de 2025	TEMA: Reunión veeduría Hospital Occidente de Kennedy
----------------------------	--

	ACTA	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14-01-2020	
		Código:	02-01-F0-0001	

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Citar a la Empresa Metro a la reunión del mes de mayo	Oficina de Participación Comunitaria	30 de mayo del 2025
Validar la viabilidad de los conductos en la fachada del costado posterior del hospital (Tanque de oxígeno)	Desarrollo institucional	Mayo 2025
Presentar el presupuesto del proyecto, sus avances con porcentajes específicos. Gestionar reunión con la Alcaldía Local de Kennedy y el IPES a fin de reubicar a los vendedores ambulantes en las zonas aledañas al Hospital Occidente de Kennedy por la obras del metro	Oficina de Participación Comunitaria	Mayo 2025
Solicitud del presupuesto final para las obras de adecuación del Hospital Occidente de Kennedy	Interventoría	Mayo 2025

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

ACTA

Versión: 3
Fecha de aprobación: 14-01-2020
Código: 02-01-FO-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 12/07/2024	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred _____ Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 25-04-2025 LUGAR: Hospital occ Kennedy HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación comunitaria HORA FINAL: _____

TEMA DE LA REUNIÓN: Reunión vecinos Hospital occidente de Kennedy

Nº	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	6760482	Carlos Gutiérrez	Kennedy	ASISTENTE	SECRETARIO	[Firma]
2	1910082	Leon Orjales	Kennedy	Hospital	Paralelo	[Firma]
3	79115373	Jairo David Cortez	C. Kennedy	Hospital Kennedy	Paralelo	[Firma]
4	1135923	Clayton Salas	Kennedy	Hospital Kennedy	Al. Inicio	[Firma]
5	17150038	Leandro Simón	As Kennedy	Hospital Kennedy	Vecedor	[Firma]
6	80218780	Fabian N. Aponte M	Kub. Cal 20	Mito e Inc	Rep. Mito	[Firma]
7	92879389	Vivian Q. B. El	Kennedy	PSAC	Rep. Oran	[Firma]
8	103417240	David Amador Cely	Subred Sur Occidente	Dpto. Inspección	Rep. Esp.	[Firma]
9	1016069972	Andrés Ovalle Romero	Subred Sur Occidente	Dpto. Inspección	Prof. Esp.	[Firma]
10	80182571	Juan Camilo Tamarit	Subred Sur Occidente	Dpto. Inspección	Interventor	[Firma]
11	1013687094	Enika Arellano Imbelli	Kennedy	Aspo Interventoría	Interventor	[Firma]
12	53159888	Laura Cardozo S	Kennedy	Aspo Interventoría	Interventor	[Firma]

ACTA

Versión: 3
Fecha de aprobación: 14-01-2020
Código: 02-01-F0-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 12/07/2024	
		Código: 02-01-F0-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	10535856-12	Seideth y Salazar A	Kennedy	SST Interventoría	SST Interventoría	[Firma]
14	53070204	HARIBO DIAZ GONZALEZ	COORDINADOR GENERAL DE KENNEDY	LABORATORIO DE RESERVA DE CUBO	LABORATORIO	[Firma]
15	9107920	CRISTHIAN RANGEL D.	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - DIET	DIR. INTERACCION TURIA Y EDUCACION	INTERACCION	[Firma]
16	1016238538	Estefany Mayorga	MLI	SCCER	Escuela	[Firma]
17	1026089220	Diana Paola Barbosa	CSPLMB	Metro Interventoría	Residente Social	[Firma]
18	11000923	Flamenco SANCHEZ	KENNEDY	Asociación de Usuarios	Asociación Social	[Firma]
19	79115203	Jairo Camacho	Kennedy	Social	Residente Social	[Firma]
20	17650038	Fernando SANCHEZ	Kennedy	Asociación de Usuarios	Asociación Social	[Firma]
21	10259106	David Ortiz Bernal	MLI	Interventoría	Interventoría	[Firma]
22	11445320	Andrés Cárdenas	MLI	Residente Social	Residente Social	[Firma]
23	25127902	Ramiro Ortiz	Asistencia	Profesional Especializado	DLU Institucional	[Firma]
24	79500535	Ramiro Ortiz	Secretaría Salud	Profesional Especializado	Arquitecto	[Firma]
25	17150038	Fernando SANCHEZ	Kennedy Hosp.	Asociación de Usuarios	Asociación Social	[Firma]
26	51613585	Margarita Alvarado	Kennedy	Veeduría	Consejera	[Firma]
27	1013070147	David S. Acosta	Asistencia	Antropología Comunitaria	Lider Sub Proceso Art. Comunitaria	[Firma]
28	112072713	Maria M. Molina	Consejo Unidad de Kennedy	Obras de Mejoramiento	Trabajadora Social	[Firma]

ACTA

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 14-01-2020
 Código: 02-01-F0-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0002	

Marque con una X según corresponda:

Reunión de Subred _____ Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 25-04-2025
(dd-mm-aaaa)

LUGAR: Hospital de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina Participación Comunitaria
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)

HORA FINAL: 10:40 am

TEMA DE LA REUNIÓN: Reunión Vecinales Hospital Occidente de Kennedy

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	1016010225	Jairo Lopez T	U33 Boston	Participación Comunitaria	Revisor de PC	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
